



# תוכנית פרויקט מעודכנת

CPR NG

מערכת רשומה רפואית

16/03/2015

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

## סדר יום

- סטאטוס נוכחי
- תוכנית עבודה
- תכולת פיתוח וחלוקה למחזורים
- לו"ז
- משמעויות פיתוח



## סטטוס נוכחי

- הערות פתוחות: בהמשך לדין שנערך ב 15/03/15, התגלה פער בין המספרים הידועים ללקוח ולספק.
  - לצורך סגירת כלל ההערות הפתוחות נדרש לעבור לעבוד על קובץ אחד ללא הוספת הערות חדשות
  - הועברו ללקוח במייל מס' שאלות שעדיין לא קיבלו מענה
- תוכנית העבודה מבוססת על כלל ההערות והמחלוקות אשר ישימים לביצוע



## תוכנית עבודה – הבהקים

- סיום אפיונים נדרש עד 29.3.2015
- כתנאי: קבלת כלל ההערות ותשובות לשאלות הפתוחות עד ל 17.3.2015
- אישור שלב האפיון – עד 15/04/2015
- חלוקה ל-4 מחזורי פיתוח (ללא שינוי מהתוכנית המקורית)
- לאור האפיונים המעודכנים, בוצעה חלוקה מחדש של תכולת הפיתוח למחזורים השונים
- תחילת פיתוח מיועדת ל 01/05/2015
- לאור התוספות שהתקבלו נדרש זמן פיתוח ארוך יותר בכל מחזור (על אף תוספת כ"א)
- שאר המשימות לא השתנו מבחינת זמני עבודה



## תכולת מחזורי פיתוח


- FAT 1 – תהליכים יחסית פשוטים, ממשקים
  - FAT 2 – תהליכים רוחביים, ממשקים
  - FAT 3 – תהליכים מורכבים, ממשקים
  - FAT 4 – תשתיות ויתרת ממשקים
- חשוב לשמור על גמישות של 10-15% בהעברת תכולות בין המחזורים.



## לו"ז - יעדים

- תאריך אחרון לסיום העברת הערות לאפיונים: 23/03/2015
- תאריך אחרון לסיום עדכון אפיונים: 29/03/2015
- אישור אפיונים: 12/04/2015
- אישור אבן דרך: 15/04/2015
- היערכות לפיתוח: 30/04/2015
- תחילת פיתוח FAT1: 03/05/2015
- תחילת פיתוח FAT2: 01/09/2015
- תחילת פיתוח FAT3: 03/01/2016
- תחילת פיתוח FAT4: 01/06/2016
- **סיום פיתוח: 02/11/2016**
- סיום הדרכות: 30/01/2017
- סיום בדיקות באתר צה"ל: 09/02/2017
- SPRR: 09/02/2017
- הכנסה לתפעול: 16/02/2017
- **עלייה לאוויר: 26/04/2017**



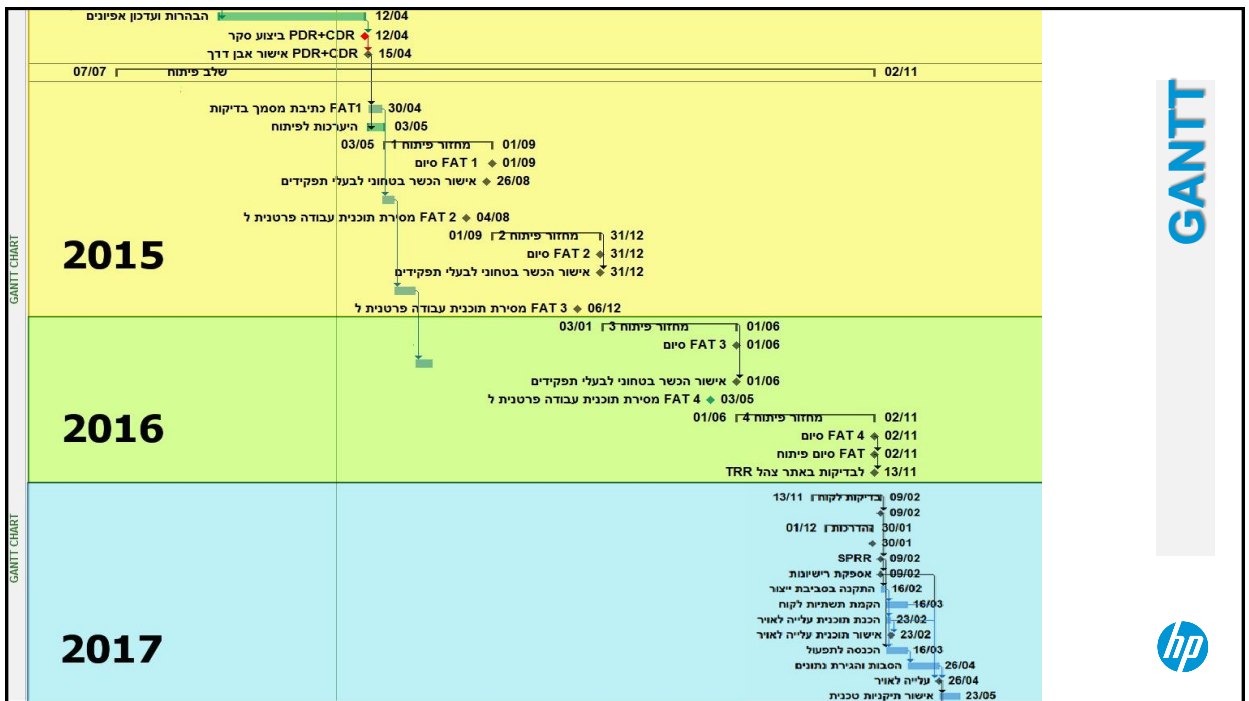

GANTT



## משמעויות פיתוח

- על מנת ליישם את דרישות הלקוח כפי שהתבקשנו , נאלץ לבצע פיתוחים עצמאיים רחבי היקף (~80% מהיקף הפיתוח), ולהתנתק מיכולות ה-SAP Standard. לעובדה הנ"ל יש משמעויות על העתיד:
  - התנתקות מנמ"ר
  - איבוד הערך המוסף של שימוש בפלטפורמה של SAP שמיושמת בעולם כולו
  - איבוד תמיכת היצרן במוצר לאור ריבוי הפתוחים העצמאיים
  - אין משמעות לשדרוגים עתידיים
  - תחזוקה: ידרשו משאבים רבים מהתכנון המקורי מאחר וקיימים פיתוחים עצמאיים רבים
  - נדרש שינוי SLA של התחזוקה
  - העברת תיקונים לסביבת לקוח מורכבת יותר



## משמעויות פיתוח

- סיכון ביצועי מערכת:
  - כמות השדות והפרמטרים לבדיקה במסגרת טבלת הגבלים
  - חילול מסמך PDF הכולל את כל סיכומי הפגישות של המטופל
  - חיווי תרשומת אישית
  - נטרול חוקים אפליקטיביים במפגש בדיעבד (שינוי שגיאות לאזהרות)
- מחלוקות שאינן ישימות מבחינה טכנית לא נכנסו לתוכנית.
  - אבחנות 120 תווים
  - הכלת מסמכים סרוקים למכתב סיכום
  - איחוד משימות למסך אחד
- התוכנית איננה כוללת משמעויות מהפגישה האחרונה שקוימה ב 15/03/15



תודה

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

